



Bergvesenet

Postboks 3021, N-7441 Trondheim

Rapportarkivet

Bergvesenet rapport nr 7004	Intern Journal nr 	Internt arkiv nr 	Rapport lokalisering 	Gradering
Kommer fra ..arkiv Bidjovagge Gruber A/S	Ekstern rapport nr 	Oversendt fra Bidjovagge Gruber a.s.	Fortrolig pga 	Fortrolig fra dato:

Tittel

Månedssrapport februar, mars, april og mai 1985

Forfatter

Østby, Torvald

Dato

År

1985

Bedrift (Oppdragsgiver og/eller oppdragstaker)

Bidjovagge Gruber A/S

Kommune

Kautokeino

Fylke

Finnmark

Bergdistrikt

1: 50 000 kartblad

18334

1: 250 000 kartblad

Nordreisa

Fagområde

Geologi,
Geokjemi

Dokument type

Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt)

Bidjovagge

Råstoffgruppe

Malm/metall

Råstofftype

Cu,Au

Sammendrag, innholdsfortegnelse eller innholdsbeskrivelse

Beskriver den driftsmessige aktiviteten i perioden februar-mai 1985. Inkludert er resultatet av diamantboring i mai. Rapportene beskriver behandling av anbud på oppstart av gruve driften, oppbygging av oppredningsverket, personellsituasjonen og den finansielle situasjon i forhold til utbyggingens budsjett.

A/S BIDJOVAGGE GRUBER

MÅNEDSRAPPORT FEBRUAR 1985

1. TEKNISK

1.1 Geologi

Ingen aktivitet.

1.2 Grube, bryting

Anbudspapirer for dambygging og grubebryting ble sendt ut i uke 7. Åpning av anbudene vil skje 18. mars. Endelig avtale for dambygging og bryting skal ifølge planen gjøres i uke 12. Tvilssom om dette kan la seg gjøre før etter påske, dvs. i uke 15-16.

1.3 Oppredningsverket

Tore W.Bang fra Alta vil utføre elektriske arbeider i oppredningsverket (lavspent) i tiden 04.03. - 20.05.

Klargjort for montasje av overhølt avskraper i konsentratfortykker. Fundament for pressfilter og skivefilter er ferdige. Montert pumper og sykkloner. Omlastingsbelte er monteret. Støpt motorfundament for den store møllen.

1.4 Annet

2 PERSONAL

Samme bemanning som tidligere i Bidjovagge, 11 personer, se bilag 1.

Vi har hatt møte i Kautokeino med elektroingeniør som kan være driftsansvarlig. Møter i Finland for å skaffe elektrikere.

3 KOSTNADER

Kostnader (1.000 NOK)

Måned		Hittil i prosj.		Hele prosj.	
Brukt	Budsjett	Brukt	Budsjett	nevidert	Budsjett
1.499	1.918	7.364	7.741	27.592	27.592

Av det som er brukt hittil utgjør ubetalte fakturaer NOK 3,15 mill. Dessuten har vi varer i ordre for NOK 3,10 mill.

Kassa-analyse, se bilag 2.

Det er søkt om å få overført NOK 2,6 mill av lånet i Sparebanken Nord.

Gruvas lån pr. 28. februar 1985 er:

- Langsiktige lån NOK 3,5 mill
- Kortsiktige lån NOK 0,644 mill.


4. FREMDRIFTSPLAN

Endelig avtale om dambygging og gruvebryting vil bli noe forsinket.
Forøvrig følges tidsplanen.

5. DIVERSE

Det er søkt om medlemskap i Norsk Arbeidsgiverforening. Alle ansatte som er interessert (frivillig) har tatt poliovaksine (1.sprøyte).

Bidjovagge, 08. mars 1985


Torvald Østby
adm.dir.

Fordeling: OKHI/J.Tanila, H.Solin, K.Vaajoensuu, J.Järvinen, P.Kerola
KTR/PSV,
OKLA/P.Huhta
BIDJO/TØ, RA, KB
I.M.Mathiassen
E.M. Ullebø

BEMANNING PR. 28.02.1985

⊗ = Norsk arbeidstaker
 x = Finsk arbeidstaker

	Stab arb.ledelse	Time- lønnede	Totalt	+ -
Adm.direktør	①			
Oppredningsverket				
Teknisk ^{net} direktør				
Arbeidsledelse				
Prosessoperatører		③		
Dagskift				
Laboratoriet				
Dagbrudd				
Gruveplanlegger				
Geolog				
gruvetekniker, dagbrudd				
Administrasjon - Vedlikehold				
Kontorsjef	1			
Sekretær	①			
Innkjøp				
Lagerforvalter	①			
Mekanisk vedlikehold				
Arbeidsleder		②		
Oppredningsverk		①		
Øvrig				
Elektrisk				
Arbeidsleder		①		
Elektrikere				
Totalt	③+1=4	⑦	11	+ - 0

FEBRUAR 1985

Fra investeringsstart

	<u>1.000 NOK</u>
Bevilget lån	3.500
Kassekreditt	<u>1.000</u>
	4.500
- Saldo pr. 28.02.1985 (Disponibelt)	<u>781</u>
Kassestrøm	3.719
	=====

	<u>1.000 FIM</u>
Kurs 0,73	2.715
Gjeld til Outokumpu Oy pr. 28.2.1985	215
Vurdert gjeld til Outokumpu Oy (ufakturert) pr. 28.2.1985	152
Ubetalte fakturaer til Outokumpu Oy	1.806
Andre ubetalte fakturaer i Finland	165
Vurdert m.v.a. av utenlandske varefakturaer	<u>84</u>
	<u>238</u>
Forbruk fra 9/1984 til og med 2/1985	5.375
Budsjettert fra 9/1984 til og med 2/1985	<u>5.650</u>
Differanse	+ <u>275</u> =====

Bidjovagge, 06.03.1985
Kalervo Brännare

MÅNEDSRAPPORT MARS 1985

1. TEKNISK

1.1. Geologi

Krister Söderholm har besøkt Bidjovagge Gruber. Han vil være BG's geolog sommeren 1985.

1.2 Grube, bryting

Anbudene for dambygging og grubebryting er åpnet. Diskutert med to aktuelle entreprenører. Planlagt møte med den ene av disse den 12.04. for endelig kontrakt.

1.3 Oppredningsverket

Montasjene går godt, horisontalsiktet er ferdig og finknuser er prøvekjørt (uten malm). Salas vertikale godspumper er ferdigmontert (inkl. el.arbeider). Regulering av vibrasjonsmatere under siloer er ikke installert ennå. Vulkanisering av transportbånd er nesten ferdig. Den store møllen er nå klar for montasje av nye foringer. Syklonpumper (2 stk.), avgangspumper (2 stk.), OK 16 flotasjonsceller, grovflotasjonscelle og LAROX pressfilter er ankommet Bidjovagge.

Av større maskiner er ikke store møllemotor levert ennå (kommer i uke 15). Skivefilter og konsentratfortykkerens driftsmekanisme er demontert i Outokumpu og klar for transport til Bidjovagge (planlagt ca. uke 16).

Elektriske arbeider utført av firma Tore W. Bang fortsetter og følger programmet.

Til elektriske høyspentarbeider har vi fått tilbud fra Norske Siemens (ca. NOK 150.000,-).

2. PERSONAL

Bemanningen er øket med 4 mann, teknisk sjef pluss 3 timelønnede. Vi er nå 15 mann totalt, se bilag 1.

Det har vært informasjoner i Outokumpu for aktuelle prosessmenn og kontakt med prosessmenn i Nord-finland.

Har dessuten hatt kontakt med el.ingeniør og elektrikere i Finland.

3. KOSTNADER

Kostnader (NOK 1.000)

MÅNED		HITIL I PROSJEKTET		HELE PROSJEKTET	
Brukt	Budsjett	Brukt	Budsjett	Revidert	Budsjett
1.948	2.452	9.311	10.194	27.592	27.592

Av det som er brukt hittil utgjør ubetalte fakturaer NOK 4,5 mill.
Dessuten har vi varer i ordre for NOK 1,1 mill. Kassa-analyse, se bilag 2.

Gruvas lån pr. 31. mars er:

- Langsiktig lån NOK 6,1 mill.
- Kortsiktig lån NOK 0,7 mill.

Overført NOK 2,6 mill fra byggelån i Sparebanken Nord i slutten av mars.

4. FREMDRIFTSPLAN

Endelig avtale om dambygging og grubebryting vil bli gjort 12.04.

bygging av ny avfallsledning er utsatt til sommeren. Rør til denne blir bestilt i løpet av april for montering til sommeren. Den gamle blir reparert for bruk inntil den nye kommer i drift, se bilag 3.

5. DIVERSE


Vi er nå medlem av Norsk Arbeidsgiverforening.

Anbudspapirer for renhold og matservering i Bidjovagge er sendt ut.

Møte med Fylkesarbeidskontoret i Vadsø (TØ, RA) angående opplæring.
Planlagt oppstart i prosessteknikk for 10 mann den 15.04.

Fått avslag på søknad om 12 timers skift. Ny revidert søknad sendes ca. 10.04.

Bidjovagge, 03. april 1985


Torvald Østby

Fordeling: OKHI/J.Tanila, H.Solin, K.Vaajoensuu, J.Järvinen, P.Kerola
KTR/PSV
OKLA/P.Huhta
BG/TØ, RA, KB, KS
I.M.Mathiassen
E.M. Ullebø

BEMANNING PR. 31.03.1985

⊗ = Norsk arbeidstaker
 x = Finsk arbeidstaker

	Stab arb.ledelse	Time- lønnede	Totalt	+ -
Adm.direktør	①			
Oppredningsverket				
Teknisk direktør	1			
Arbeidsledelse				
Prosessoperatører		③		
Dagskift				
Laboratoriet				
Dagbrudd				
Gruveplanlegger				
Geolog				
gruvetekniker, dagbrudd				
Administrasjon - Vedlikehold				
Kontorsjef	1			
Sekretær	①			
Innkjøp	①			
Lagerforvalter				
Mekanisk vedlikehold				
Arbeidsleder				
Oppredningsverk		③		
Øvrig		③		
Elektrisk				
Arbeidsleder				
Elektrikere		①		
Totalt	③ + 2 = 5	⑩	15	+ 4

MARS 1985

Fra investeringsstart

NOK 1.000

Bevilget lån	6.100
Kassekreditt	<u>1.000</u>
	7.100
- Saldo pr. 31.03.1985 (Disponibelt)	<u>2.673</u>
	<u><u>4.427</u></u>

Forpliktelser

Kassestrøm	4.427
Gjeld til Outokumpu Oy pr. 31.03.1985	300
Vurdert gjeld til Outokumpu Oy (ufakturert) pr. 31.03.1985	50
Bet. og ubet. fakturaer til Outokumpu Oy	2.229
Andre bet. og ubet. fakturaer i Finland	1.732
Vurdert m.v.a. av utenlandske varefakturaer	350
Ubetalte fakturaer i Norge	931
- Kassestrømforandring	<u>708</u>
	<u>9.311</u>

Forbruk fra 9/1984 til 3/1985	9.311
Budsjettert fra 9/1984 til og med 3/1985	<u>10.194</u>
Differanse	+ 883
	=====

Det er ikke tatt hensyn til proformafakturaer og tilbakebetaling av m.v.a.

Bidjovagge, 03.04.1985
Kalervo Brännare

MÅNEDSRAPPORT APRIL 1985

1. TEKNISK

1.1 Geologi

Avtale er gjort med finsk firma for diamantboring i Bidjovagge. Start i uke 19. Totalt ca. 800 m i A-, C- og D-brudd.

1.2 Grube, bryting

Avtale er gjort med Leonard Nilsen & Sønner om dambygging og malm-bryting i Bidjovagge. De starter rigging i uke 19. Detaljdiskusjoner med entreprenøren fortsetter.

1.3 Oppredningsverket

Monteringen går bra. Følgende utstyr er nå montert: Transportbelte utenfra og inn i verket, store møllemotor, sykkloner, grovflotasjons-cellen, store OK-16 flotasjonsceller (2 stk-), drivmekanismen til konsentratfortykkeren, Larox-pressfilter og avgangspumper.

Foringer til store møllen er under montering. Arbeidet med gods- og vannledninger fortsetter. Elektriske arbeider med lavspent (firma Tore Bang) og høyspent (firma Siemens) pågår.

Instrumenteringen er bestilt og montasjen vil bli utført av montør fra OKP.

2. PERSONAL

Bemanningen er økt med 5 mann, flotasjonsformann pluss 4 timelønnede. Av de timelønnede er en ansatt på korttidskontrakt (2-3 måneder) som snekker. Vi er nå totalt 20 ansatte, se bilag 1.

Startet intern opplæring av 10 mann i prosesseteknikk.

Ansvarlig driftsleder for elektriske anlegg er ansatt fra 01.06.1985 (norsk). Elektrotekniker er ansatt fra 01.05.1985 (finsk). Han vil være på opplæring i Finland frem til midten av mai.

Annonsert i norske aviser etter gruveovervåker uten å fått noen. Prøver nå å skaffe en fra Finland.

3. KOSTNADER

Kostnader (NOK 1.000)

MÅNEDEN		HITTIL I PROSJEKTET		HELE PROSJEKTET	
Brukt	Budsjett	Brukt	Budsjett *)	Revidert	Budsjett
4.173	3.212	13.484	13.869	27.592	27.592

*) Månedfordelingen er revidert.

Av det som er brukt hittil utgjør ubetalte fakturaer NOK 5,2 mill, i tillegg har vi varer i ordre for NOK 1,2 mill. Kassa-analyse, se bilag 2

Finansiering:

- Bevilget lån fra Sparebanken Nord, NOK 7,5 mill
- Bevilget kassakreditt fra Sparebanken Nord, NOK 1,0 mill
- Bevilget byggelån fra D.U.F., NOK 6,1 mill

Disponibelt pr. 30.04.1985:

- Langsiktige lån NOK 5,6 mill
- Kortsiktige lån NOK 0,5 mill

4. FREMDRIFTSPLAN

Instrumentering- og skivefiltermontasjen i verket er forsinket, slik at vi er 1 uke etter planen. Prøvekjøringen starter som planlagt til tross for dette.

*) Planene for avgangs- og returvannsystem er revidert. Benytter gamle systemet frem til sommeren. Bestilt materiell til nye systemet. Også endret planene for Reisavannlinjen. Den gamle vil bli reparert til sommeren, dvs. ingen nybygging. Se bilag 3.

*) Bygningsmessige arbeider vil foregå kontinuerlig i tiden utover. Må også leie inn arbeidskraft for å få reparert hybler og fellesrom.

5. DIVERSE

Kautokeino Industriservice fortsetter som entreprenør for renhold og matservering.

Sent ny søknad om 12 timers skift.

Forhåndsbestilt hotellrom i Kautokeino i forbindelse med åpning av A/S Bidjovagge Gruber.

- | | |
|------------------------|--------|
| - Natt 19.-20. juni: | 5 rom |
| - Natt 20.-21. juni: | 20 rom |
| - Natt 21.-22. juni: | 5 rom |
| - Natt 05.-06. august: | 20 rom |

Bidjovagge, 8. mai 1985

Torvald Østby

Torvald Østby
adm.dir.

Fordeling: OKHI/J.Tanila, H.Solin, K.Vaajoensuu, J.Järvinen, P.Kerola
KTR/PSV
OKLA/P.Huhta
BG/TØ, RA, KB, KS, TVä
I.M.Mathiassen
E.M.Ullebø

Bilag 1

A/S BIDJOVAGGE GRUBER
REIJO ANTONEN/KALERVO BRÄNNARE

2.5.1985

BEMANNING PR.30 4.1985

	stab arb.led. norsk/finsk	time lønn. norsk/finsk		Totalt norsk/finsk		TOTALT NORSK+ FINSK	
Adm.direktør	1			1	0	1	
Gruve							
Dagbrudd - Knusing							
Gruveplanlegger				0	0	0	
Geolog				0	0	0	
Gruveovervåkare				0	0	0	
Oppredn.verk/vedl.hold							
Teknisk sjef	1			0	1	1	
Oppredningsverket							
Arbeidsledelse	1			0	1	1	
Prosessoperatører		4	1	4	1	5	
Dagskift		2		2	0	2	
Laboratorium				0	0	0	
Mekanisk vedlikehold		6					
Elektrisk vedlikehold							
Elektrosjef				0	0	0	
Arbeidsleder				0	0	0	
Elektrikere		1		1	0	1	
Administrasjon							
Kontorsjef	1			0	1	1	
Sekretär	1			1	0	1	
Innkjøp				0	0	0	
Lagerforvalter		1		1	0	1	
Totalt	2	3	14	1	16	4	20

A/S BIDJOVAGGE GRUBER
KALERVO BRÄNNARE

2.5.1985

Bilag 2

APRIL 1985

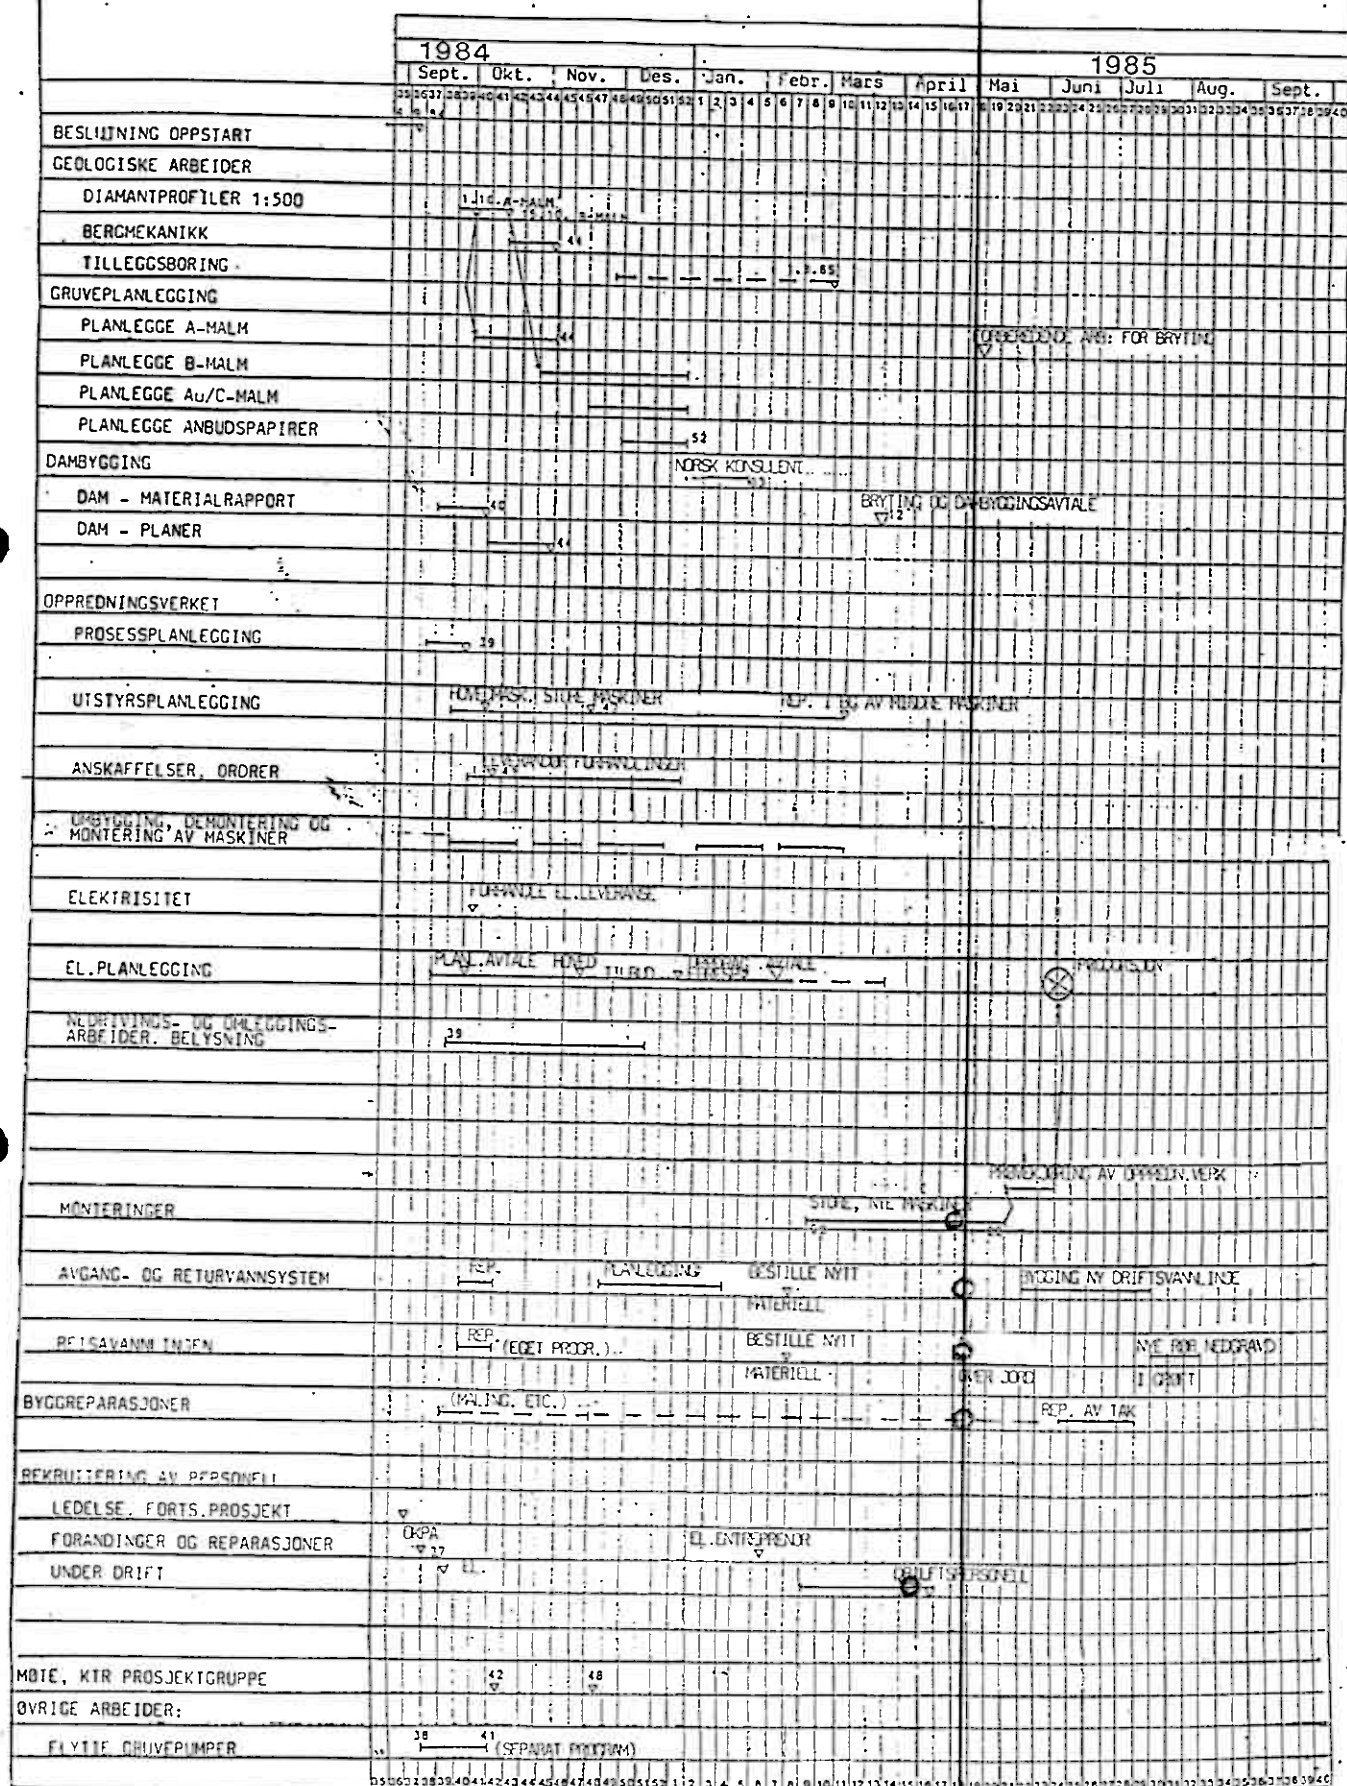
Fra investeringsstart	NOK 1000
Bevilget lån fra Sparebanken Nord	7500
Bevilget kassekredit fra Sparebanken Nord	1000
Bevilget byggelån fra DUF	6100
	<u>14600</u>
Saldo pr. 30.4.1985 (Disponibelt)	6111
	<u>-----</u>
Kassestrøm pr 30.4.1985	8489
Forpliktelser	
Kassestrøm pr. 30.4.1985	8489
Gjeld til Outokumpu Oy pr. 30.4.1985	300
Vurdert gjeld til Outokumpu Oy (ufakturert) pr. 30.4.1985	350
Ubet. fakturaer til Outokumpu oy *)	2523
Andre ubet. fakturaer i Finland *)	1886
Ubetalte fakturaer i Norge *)	836
Vurdert m.v.a. av utenlandske varefakturaer	187
-Vurdert m.v.a tilbakebet. av januar-februar	506
-Vurdert m.v.a. tilbakebet. av mars-april	699
	<u>13366</u>
Forbruk fra 9/1984 til 4/1985	13366
Budsjettet fra 9/1984 til og med 4/1985	13869
	<u>-----</u>
Differanse	503
	<u>=====</u>

*) Inkluderer 3056 TNOK betalinger (SWIFT-betalinger) til Finland og 606 TNOK betalinger til Norge, som vi har sendt til banken i mars, men banken har ikke belastet vår konto.



BIDJOVAGGE

T I D S P L A N



MÅNEDSRAPPORT MAI 1985

1. TEKNISK

Sommeren er forsinket 2 - 3 uker. Dette skaper problem for entreprenøren p.g.a. mye snø og is og tele i bakken. Avgangsdammene kan ennå ikke benyttes da isen fortsatt ligger der.

1.1 Geologi

Det er diamantboret i A-, C,- og D-malmene, tilsammen ca. 900 bormeter.

Fått noen resultater for A-malmen, de øvrige er ennå ikke kommet.

1.2 Grube, bryting

Etter diamantboringene er adkomsten til A-bruddet flyttet litt lengre mot nord. Brytingen er 1 uke forsinket p.g.a. den sene sommeren.

1.3 Oppredningsverket

Noe forsinket i oppredningsverket p.g.a. uforutsatte arbeider:

- Bunnen i de gamle flotasjonscellene (8 stk.) var rustet hull i og måtte skiftes ut.
- De gamle vannledninger i verket var ubrukbare. Nytt er under montasje.
- Nødvendig instrumentering for prøvekjøring er montert, men øvrige er forsinket p.g.a. sene leveranser og vil bli montert etter oppstart.

Startet prøvekjøring av enkelte maskiner som transportbånd, finknuser, begge møllene og flotasjonscellene. Står igjen å ferdigstille konsentratlager, diverse instrumentering og litt el.arbeider i verket.

Noe elektriske arbeider ute er ikke utført. Venter til bakken er blitt telefri.

2. PERSONAL

Bemanningen er økt med 4 mann, arbeidsleder og 3 timelønnede. Vi er nå 24 ansatte, se bilag 1. I begynnelsen av juni vil bemanningen øke betraktelig (finske prosessoperatører). Det forhandles om ansettelse av elektrikere. Geolog og adm.dir. vil i fellesskap ta seg av gruveovervåkingen inntil videre. Forhandler med bergingeniør (Yrjö Huhtamäki) om ansette fra 12.08.1985. Han vil også kunne foreta gruveplanlegging.

3. KOSTNADER

Kostnader (NOK 1.000)

MÅNED		HITIL I PROSJEKTET		HELE PROSJEKTET	
Brukt*	Budsjett*	Brukt*	Budsjett	Revidert*	Budsjett*
4.895 ₁₎	4.225	18.261 ₁₎	18.097	27.592	27.592

* Inkludert NOK 0,7 mill som er budsjettert, men ikke utført ennå.

1) Inkludert NOK 0,4 mill. diamantboring som ikke er i investeringsbudsjettet.

Av det som er brukt utgjør ubetalte fakturaer NOK 3,5 mill, i tillegg har vi varer i ordre for NOK 0,6 mill. Kassaanalyse, se bilag 2.

Finansiering:

- Bevilget lån fra Sparebanken Nord, NOK 7,5 mill.
- Bevilget kassakreditt fra Sparebanken Nord, NOK 1,0 mill.
- bevilget byggelån fra DUF, NOK 6,1 mill.
- Bedriftsinntern opplæring, NOK 1,0 mill.

Lånene fra Nordiska Investeringsbanken (NIB) er forsinket, da lisens fra Norges Bank mangler. For å hjelpe vår likviditet har inntil lånene fra NIB er i orden, Sparebanken Nord gitt tillatelse til å overtrekke byggelånskontoen med inntil NOK 3,0 mill.

Disponibelt pr. 31.05.1985:

- Langsiktige lån NOK 0,01 mill
- Kortsiktige lån NOK 1,00 mill

Pluss muligheten til å overtrekke byggelånet med NOK 3,0 mill.

4. FREMDRIFTSPLAN

Instrumenteringen og prøvekjøring av verket er forsinket. Regner alikevel med å starte produksjonen i uke 24.

Fast gruveovervåker kommer fra 12.08.1985. Fortsatt problem å skaffe elektrikere, men det forhandles med el.firma om leie av folk inntil videre. Se bilag 3.

Reviderte planer for avgangs- og returvannsystem og for Reisavannlinjen. se april rapport.

5. DIVERSE

Fått muntlig beskjed om at både søknaden om 12-timers skift og utslipps-tillatelsen er i orden.

Fått tilsagn om tilskudd til bedriftsintern opplæring ut året 1985.
Det blir problematisk å få ut NOK 3,0 mill til opplæring dette året.

Bidjovagge, 10. juni 1985

Torvald Østby

Torvald Østby

Fordeling: OKHI/J.Tanila, H.Solin, K.Vaajoensuu, J.Järvinen, P.Kerola
KTR/PSV
OKLA/P.Huhta
BG/TØ, RA, KB, KS, TVä
I.M. Mathiassen
E.M. Ullebø

A/S BIDJOVAGGE GRUBER
KALERVO BRÄNNARE/GERD ØSTBY

10.6.1985

Bilag 1

BEMANNING PR.31.5.1985

	stab arb.led.	time lønn.	Totalt	TOTALT
	norsk/finsk	norsk/finsk	norsk/finsk	NORSK+ FINSK
Adm.direktør	1		1	1
Gruve				
Dagbrudd - Knusing				
Gruveplanlegger			0	0
Geolog			0	0
Gruveovervåkare			0	0
Oppredn.verk/vedl.hold				
Teknisk sjef	1		0	1
Oppredningsverket				
Arbeidsledelse	1		0	1
Prosessoperatører		4	4	4
Dagskift		2	2	2
Laboratorium			0	0
Mekanisk vedlikehold		6	6	6
Elektrisk vedlikehold				
Elektrosjef			0	0
Arbeidsleder	1		0	1
Elektrikere		1	1	1
Administrasjon				
Kontorsjef		1	0	1
Skretår	1		1	1
Innkjøp			0	0
Løseforvalter		1	1	1
Totalt	2	4	16	24

A/S BIDJOVAGGE GRUBER
KALEROV BRÄNNARE

10.6.1985

Bilag 2

MAI 1985

Revidert

Fra investeringsstart	NOK 1000
Bevilget lån fra Sparebanken Nord	7500
Bevilget kassekredit fra Sparebanken Nord	1000
Bevilget byggelån fra DUF	6100
Opplæringstilskudd	1000
	15600
Saldo pr. 31.5.1985 (disponibelt)	1372

Kassestrøm pr 31.5.1985	14228
Forpliktelsen	
Kassestrøm pr. 31.5.1985	14228
Gjeld til Outokumpu Oy pr. 31.5.1985	300
Vurdert gjeld til Outokumpu Oy (ufakturert) pr. 31.5.1985	200
Ubet. fakturaer til Outokumpu oy *)	212
Andre ubet. fakturaer i Finland *)	1713
Ubetalte fakturaer i Norge *)	1523
Budsjettert, men ikke utførte arbeidene	700
Vurdert m.v.a. av utenlandske varefakturaer	185
-vurdert m.v.a. tilbakebet. av mai	500
-vurdert m.v.a. tilbakebet. forendring fra mars-april	300

	18261
Forbruk fra 9/1984 til 5/1985	18261
Budsjettert fra 9/1984 til og med 5/1985	18097

Differanse	-164
	=====

*) Inkluderer 651 TNOK betalinger (SWIFT-betalinger) til Finland og 984 TNOK betalinger til Norge, som vi har sendt til banken i mai, men banken har ikke belastet vår konto.

GEOLOGENS MÅNEDSRAPPORT MAJ 1985

1. Geologiska undersökningar

Kalajoen Timanttikauraus Ky utförde diamantbörningar i Bidjovagge under tiden 07.05. - 28.05.1985. Sammanlagt borrades ca. 906 m i A-, D- och guldmalmen enligt följande:

Malm	Profiler	Borrhål	Meter
A	4	4	177
D	5	8	493
guldmalm	3	4	236
Tillsammans	12	16	906

I A-malmen borrades två extra hål eftersom malmen fortsätter längre än beräknat mot norr. Val av god entreprenör, lämplig utrustning (Toram II) och rätt diameter på hålen (T 56) gjorde att resultatet, ca. 20 m/skift, närmar sig rekord i arktiska förhållanden. Diamantbörningsräkningen blev på ca. 256.000 FIM (+ 20 % moms = 307.000 FIM). 256.000 FIM ; 906 M = 282 FIM/m. Räkningen blev alltså som beräknat trots att ca. 76 m extra borrades.

Spjälkning av borrhämnarna, krossning och malning av proven har gjorts på Bidjovagge, analyserna i Esbo (Outokumpu Oy, Malminetsintä). De första resultaten kom inom en vecka med telefax: Bl.a. i profil N 160 i A-malmen; 5,2 m med 1,4 % Cu och 4,80 g/t Au (2,75 red).

A/S Bidjovagge Gruber köpte en "minidrill" för undersökning av malmgränserna på ytan. Dammbörningen och "minidrill"-börningen påbörjas i juni i A- och i Guldmalmen förutsatt att bergavtäckningen har gjorts i tid.

Ett halvt års kontrakt rörande gruvmätning har gjorts med Mittamiehet Oy.

2. Brytning

Brytningsplanerna har delvis reviderats bl.a. har vägen till A-dagbrottet flyttats mot norr. Gammal bruten malm ligger utspridd runt Bidjovagge Gruber, tillsammans några tusen ton delvis rik malm. En del av denna malm samlades i slutet av maj på hög för anrikningsförsöken i början av juni.

Brytningsentreprenören, Leonhard Nilsen & Sønner från
Risøyhamn, flyttade en del av sin maskinpark till
Bidjovagge sista dagarna i maj.

Bidjovagge, 30. maj 1985

Krister Söderholm
Krister Söderholm

c/ UKP/H.Wennerwirta, P.Kerola
KTR/J.Reino - PSV - EAR - TTK - PSS - MS - J.Reino
BG/TØ, RA, KS
