



Bergvesenet

Postboks 3021, 7002 Trondheim

Rapportarkivet

Bergvesenet rapport nr BV 1371	Intern Journal nr 1133/92	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering Trondheim	Gradering Fortrolig
Kommer fra ..arkiv	Ekstern rapport nr	Oversendt fra Grong Gruber a.s.	Fortrolig pga Prospekteringsfondet	Fortrolig fra dato:
Tittel Utførte malmundersøkelser ved Rørvatn, Røyrvik kommune				
Forfatter Reinsbakken, Arne		Dato 26.06 1992	Bedrift Grong Gruber A/S	
Kommune Røyrvik	Fylke Nord-Trøndelag	Bergdistrikt Trondheimske	1: 50 000 kartblad 19244	1: 250 000 kartblad Grong
Fagområde Boring	Dokument type Prospekteringsfondet	Forekomster Rørvatn		
Råstofftype Malm/metall	Emneord Cu Zn			
Sammendrag Kort rapport med fargelagt logg fra forlengelsen av borhull 4/98 fra 374 - 604 meter. Resultatet ble såpas negativt at planlagt hull vest for Bh 3/79 ble sløyfet.				

Bergvesenet
Postboks 3021 Lade
7002 Trondheim

BERGVESENET

Mottatt: - 1001 332

J.nr.: 7133/92

Saksbeh.: BL

	Sett	Kopi
ON	<i>[Signature]</i>	
AIH		

1/7-92

Deres ref.

Vår ref. AH/AR/hkw

Dato, 26. juni 1992

RAPPORT: UTFØRT MALMUNDERSØKELSER VED RØRVATN, RØYRVIK KOMMUNE.

Vi viser til rapporteringsregler angående tilskudd til prospektering etter malm, KAP 948, Statsbudsjettet 1991, og sender herved en kort oppsummering av utført malmletingsarbeid ved Rørvatn i Røyrvik kommune (bilag 1).

Grunnlag for støtte: (se søknad av 13.febr. 1991)

Forlengelse av Bh 4/89 med 200 m

Boring (700 m) vest for Bh 3/79

SUM

kr. 68 000,-

kr.250 000,-

kr.318 000,-

Hvorav støtte er gitt inntil 40% av faktiske utgifter begrenset opp til kr.127 200,-.

Prosjekt arbeidsbeskrivelse:

Arbeidet startet med forlengelsen av Bh 4/89 med 230 m, fra 374 til 604 m.

Boringen viser: (se bilag 2)

374 - 530 m: mørk, klorittrik grønnstein med mindre pyritt impregnasjoner (som over).

530 - 580 m: vekslende felsitt og mørk grønnstein.

580 - 604 m: lys, kalkrik grønnstein.

Resultatet var negativt, i og med at mineralisering ikke var funnet før den lyse, kalkrike grønnstein-horisonten var truffet. Denne lyse grønnsteinen er antatt å være yngst og er ikke kjent som en malmførende enhet i området.

Boring i Bh 4/89 begynte også å bli såpass vanskelig at hullet ble avsluttet ved 604 m.

Diamantboring vest for Bh 3/79 ble sløffet i og med det negative resultatet i Bh 4/89.

En rapport om revisor-attestert faktiske utgifter i prosjektet er tidligere sendt til Bergvesenet.

Med hilsen

GRONG GRUBER AS

Arve Haugen

Verksdirektør


Arne Reinsbakken
Arne Reinsbakken
Prosp.leder

GJERSVIKRUET

Ø-V Snitt gjennom Bh 4/89

ØT

VEST
V

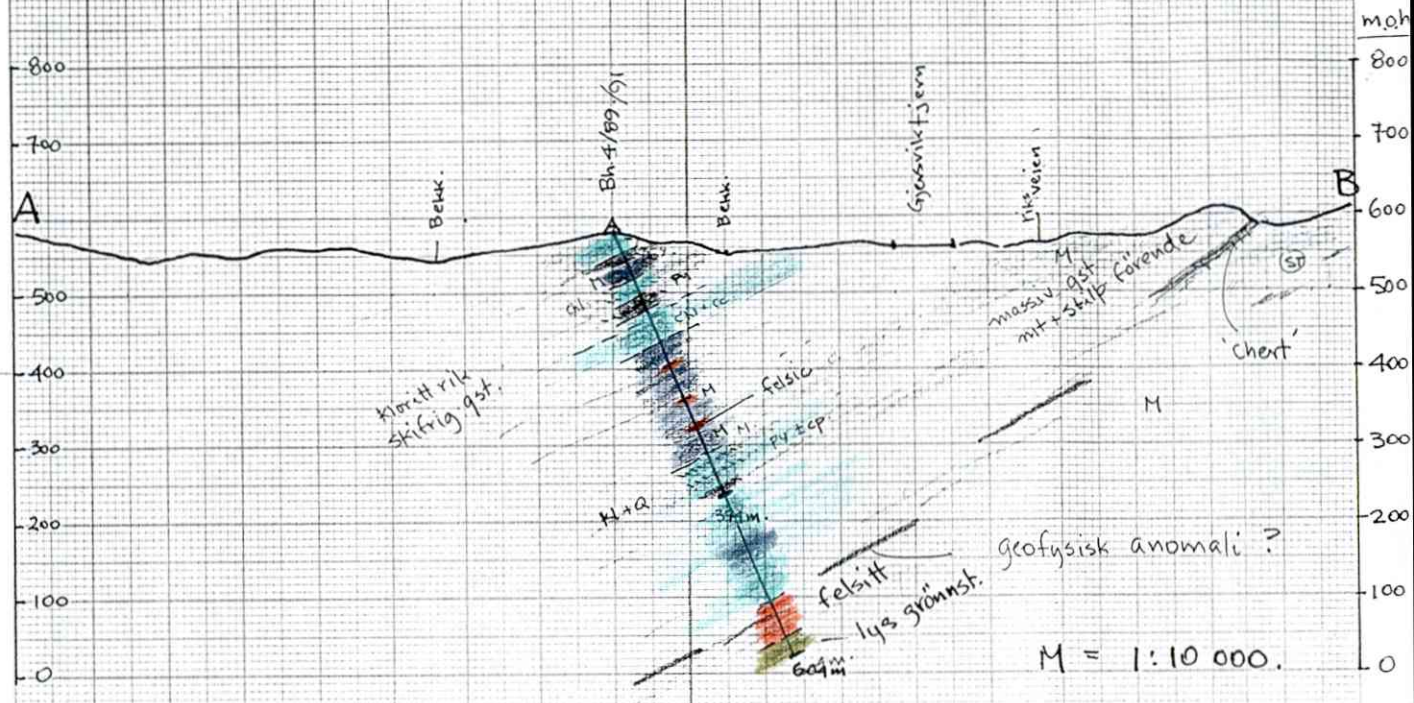

Bilag 2
