



Bergvesenet

Postboks 3021, N-7441 Trondheim

Rapportarkivet

Innlegging av nye rapporter ved: Arve

Bergvesenet rapport nr 5104	Intern Journal nr	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering	Gradering
Kommer fra ..arkiv Elkem Skorovas AS	Ekstern rapport nr P4-60-1	Oversendt fra Bidjovagge Gruber a.s.	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:

Tittel

Diamantboringer i Finnbur 1914

Forfatter

Dato År

1914

Bedrift (Oppdragsgiver og/eller oppdragstaker)

Elkem Skorovas AS

Kommune

Grong

Fylke

Nord-Trøndelag

Bergdistrikt

1: 50 000 kartblad

18234

1: 250 000 kartblad

Grong

Fagområde

Boring

Dokument type

Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt)

Finnbur Grube

Råstoffgruppe

Malm/metall

Råstofftype

Cu,sl,py

Sammendrag, innholdsfortegnelse eller innholdsbeskrivelse

2 stk brev av 02.mai og 07 juli som beskriver plan og justering av plan for boringene ved Finnbur.
Det beskrives plasserin av 5 hull på Finnbur-gangen, 2 på Nord-gangen, 2 på Midtre gang og 2 på østre gang.
Snitt gjennom synken

2 Juli

14.

MHS/MS

Herr Fredrik Sivertsen,

Godejord,

F i n b u r g.Diamantboringer.

Det er høist beklagelig, at boringerne har gitt saa dærlige resultater, de er jo fuldstændig negative. Tiltrods herfor vil vi dog endnu gjøre et sidste forsøk, inden alt indstilles.

Borhul No. 3

maa rykkes nærmere kisen utgaaende i dagen, ca. 20 meter eller kanske endnu nærmere og bores vertikalt som gaardagens telegram lyder. Ved ca. 43 meter burde kisen da paatræffes. Finder vi ikke kisen, kan hullet endnu bores til ca. 55 m. men ikke mere; under alle omstændigheter ikke længere end til 60 meter. Hermed avsluttes boringerne i Finkurgangen.

I nordre gang maa

Borhul no. 6 bores. Dette placeres ca. 20 meter fra kisen utgaaende og bores vertikalt, Ved nogle og firti meter bør kisen forefindes. Hvis saa ikke er tilfældet, maa boringerne fortsættes til 60 m., men ikke dypere. Blir resultaterne ogsaa herav negative, indstilles samtlige boringer, og feltet faar bero indtil videre.

Da Ingeniør Smith ikke faar anledning til at komme op, anmodes Ing. Tidemand om at besøke Dem. Med ham maa De da raadføre Dem om boringer og eventuelle andre arbejder. Send derfor fra nu av alle boreresultater baade til kontoret her og til Ing. Tidemand paa Skorovas. Hver uke eller oftere maa sendes rapport.

Antageligvis kommer Professor Vegt op til Finbur og Sanddøla distrikt i den nærmeste fremtid. De bedes at ta godt imot ham, meddele ham alle nødvendige oplysninger og det han ønsker at vite.

La os faa vite hvad indtryk han har faat av gruben og om han har ytret noget om feltet.

Er b ø d i g e t,

DET NORSKE A/a
for elektrokemisk Industri

30/5/14.

HHS/MS

Herr Fredrik Sivertsen,

Finbur Gruber,

Qrona.

Deres brev av 15 ds. samt 8 anmeldelser og 3 mutingsbreve har vi rigtig mottat, og efter at samme er avskrevet, returneres de herved. Samtidig vedlægges 2 avskrifter av hvert exemplar, saa at De kan paaføre dem hvad yderligere tilkommer og pr. omgaende returnere det til os. Alle papirer maa holdes i haend med fornyelseamutinger og frister samt delgivning til grundeierne. De paalægges specielt at ha Deres opmerksomhet fæstet herpaa.

Diamantboringer.

Uken efter pintse kommer borformand og hjælpere op efter ordre herfra. Formoder De har ordnet med alt overensstemmende med den mundtlige avtale.

Vedlegger herved 2 schematiske blaakopier av Finburfeltet til vejledning ved boringerne.

Finburgangen.

Her skal 5 huller bores, vertikalt, paa de med cirkler avmerkede plasser. Profilerne 1 - 5 viser hver huller skal placeres

7.5.

av hullerne
fra kisens utgaende i dagen og i dypet, hvor man formoder kisen skjæres.
Naturligvis kan De vælge avstandene for et og andet hul noget anderledes
paa grund av terrenet, men ikke nogen større avvigelse. Blir utfaldet
av disse boreriger godt, lar vi bore yderligere, og begynder ved

Nordre Gang.

Borhul No. 6 = pæl No. 8 plasseres som profilet viser, ca. 30 m
fra kisens utgaende mot nord og vertikalt.

Borhul No. 7 = pæl No. 28 sættes likeledes 30 meter fra kisen
mot nord. Dette borhul bores under 25° fald først, og om man støter paa
god kis, ogsaa vertikalt fra samme boreplass.

Mittre Gang.

Borhul No. 8 = pæl No. 5 se plasseringen i profil No. 8.

Borhul No. 9 = pæl No. 15. Efter avstanden ca. 30 meter mot
nord med draget fra kisens utgaende, og sættes hullet først under 25°
fald, og derpaa, hvis godt resultat, vertikalt i samme boreplass.

Søstre Gang.

Borhul No. 10 = pæl No. 3 plasseres under 25° vinkel først,
og derpaa vertikalt fra samme boreplass, hvis utfaldet er godt.

Borhul No. 11 = pæl No. 13 sættes kun vertikalt og videre
arbeider avhenger av utfaldet av det foregaaende borhul.


Sergangen.

Boringerne her faar indtil videre staa hen, da eiendomsfor-
holdene kanske er tvilsomme.

Skulde noget ikke være klart, eller De skulde ønske at vite
noget angaaende borerigerne, saa meddel dette straks for at undgaa for-
sinkelse. Studer nsie især profilerne, som ogsaa vedlægges. Kontrakten
med diamantboringsselskapet vedlægges, men saa ikke utleveres eller
vises til nogen utenforstaaende.

Arbeidsdag.

Bilag:
Diamantb.
kontrakten,
kopier 8 og 3.
3 blackopier.

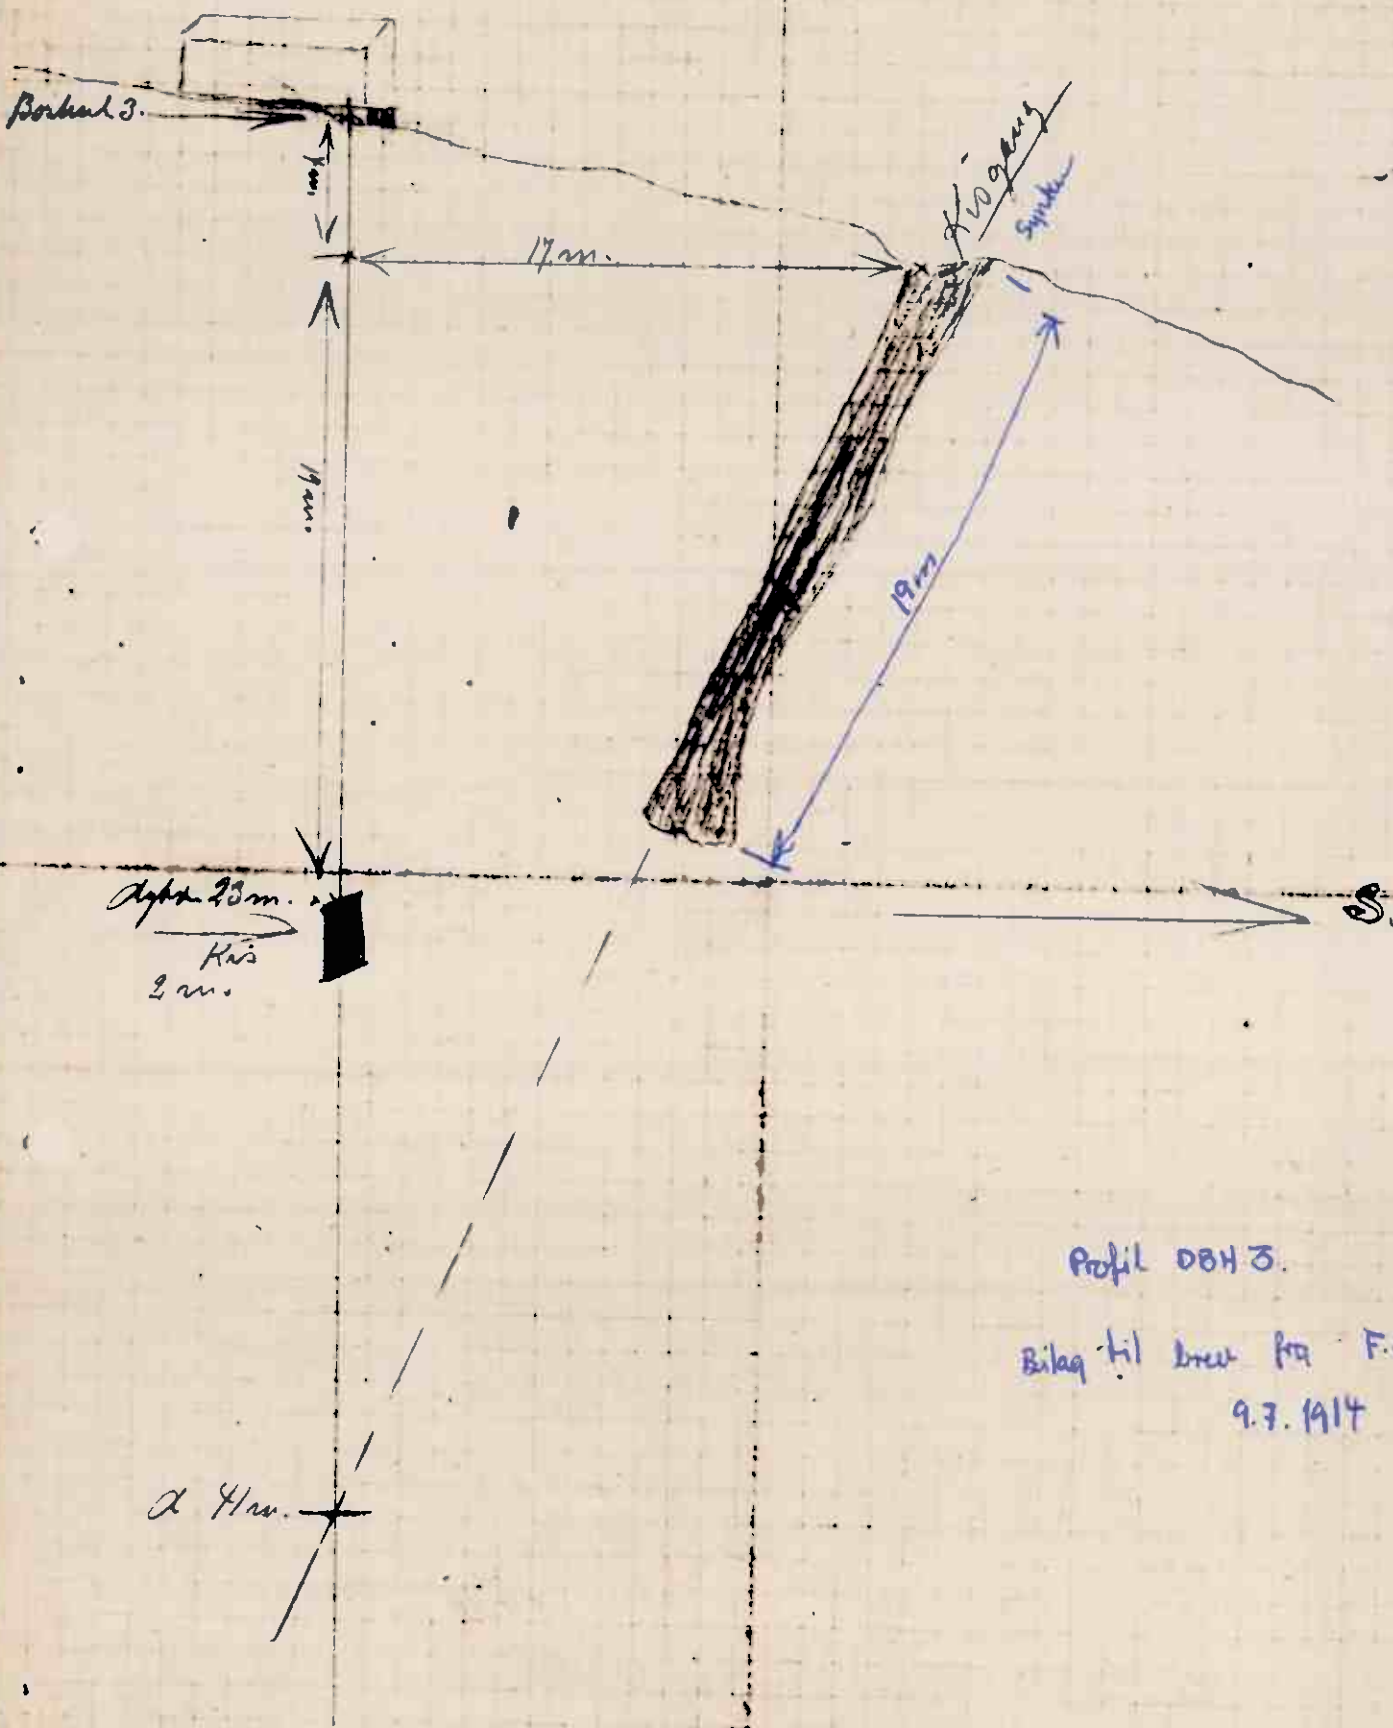

Profil DBH 3.
Bilag til brev fra F.S
9.7.1914
