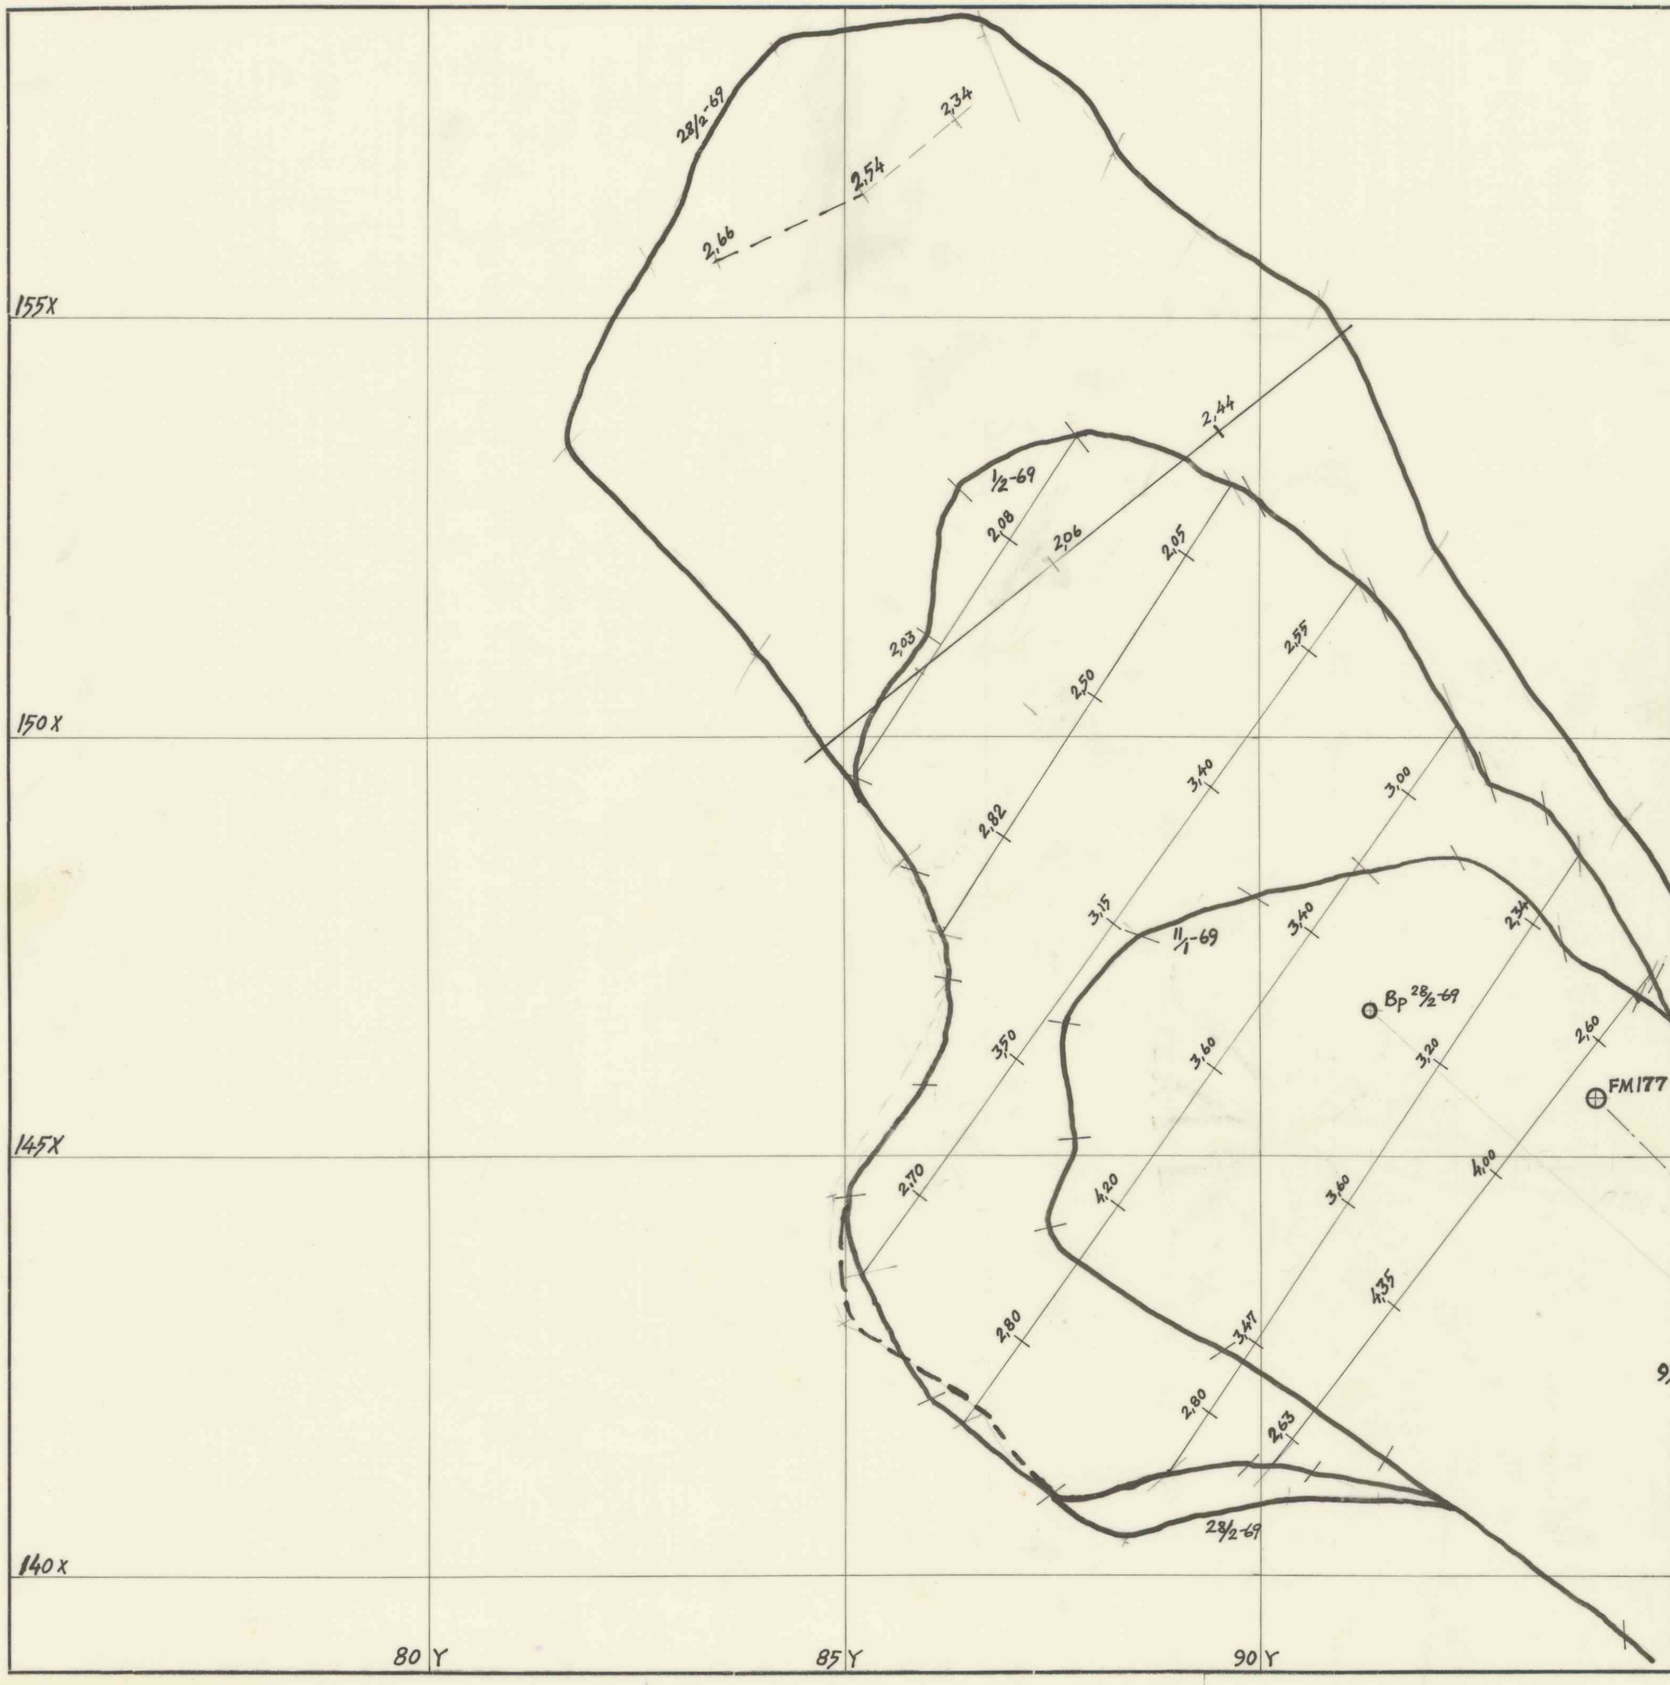

Strosse 1/III - ang. akkordoppgjør for februar 1969

Arealmåling - pl. meter avlesn. : 2540, 2550, 2565, 2575
Middel = 2558
50m² = 5226
Arealet = 50m² x 2558/2320 = 55,13

Høydemåling - 2,03 - 2,06 - 2,44 - 2,66 - 2,54 - 2,34
Middel = 2,35

Volumet av brutt masse (fast m³) = 55,13 m² x 2,35m = 129,6 m³

Malm fra taket i gammelt areal er ikke medtatt, og arb. timene for denne brytingen skal holdes utenfor beregningen av time fortjenesten i akkorden. EM.

Strosse 1/III - ang. akkordoppgjør for januar 1969.

Arealmåling - planimeter avlesning: A = 2,420 - 2,425 - 2,430. Middel = 2,425
50m² = 2,320
A = 50m² x 2,425/2,320 = 52,26 m².

Høydemåling - høyder som faller innenfor det utdrevne arealet:
2,63 - 2,80 - 3,47 - 2,80 - 4,20 - 3,00 - 2,70 - 3,50 - 3,15 - 3,40 - 2,55 - 2,82 - 2,50 - 2,05 - 2,08
Middel = 2,91 m

Volumet av brutt masse (fast m³) = 52,26 x 2,91 = 152,1 m³

Dato	Konstr./Tegnet	Tracet	Målestokk	
Målt 1/2-69 EM	1/2-69 EM	5/2-69 EM	1:50	Ajourf. 2/2-69 EM
Kontroll	Stand.kontroll	Godkjent		

Strosse 1/III - Loftet.
Ang. akkordoppgjør

Erstatning for: | Erstattet av:

Henvisning: | Beregning:
